




BISMARCKHAUS
Innovation trifft Leidenschaft


„Bismarckhaus“ in 70197 Stuttgart

Stand der Baustelle



Bauvorhaben: „Bismarckhaus“, Schwabstr. 75-77 in 70197 Stuttgart
Betrachtungszeitraum: November 2013 - Januar 2014
Bauherr: Demiri

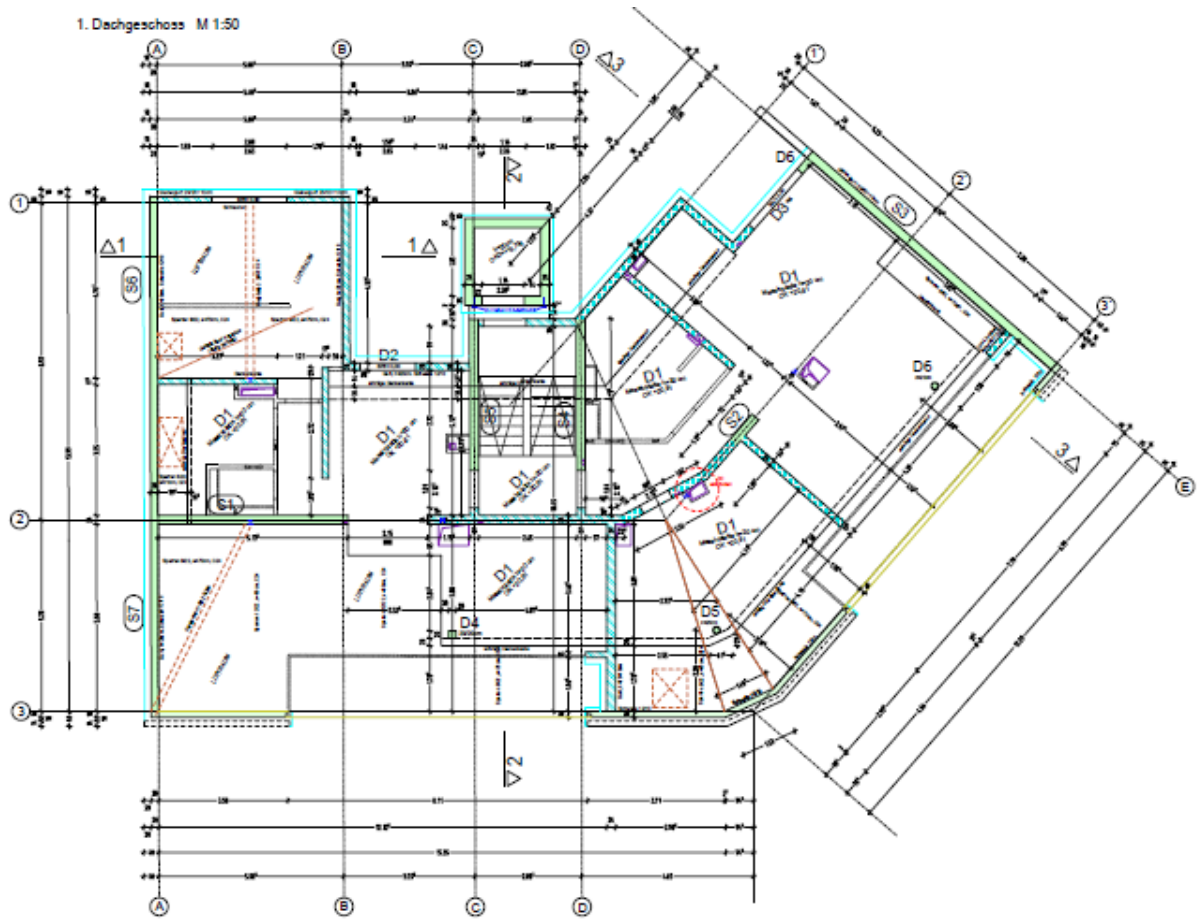

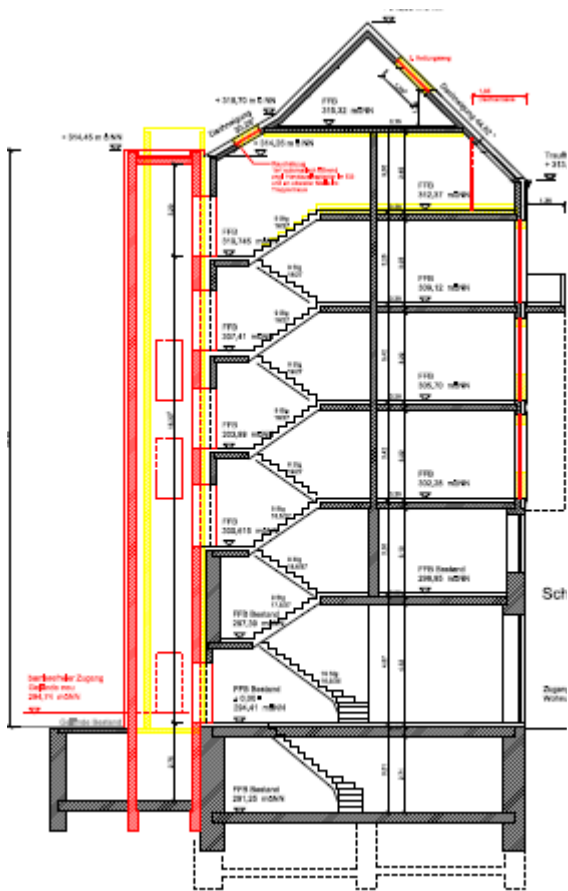

Landeshauptstadt Stuttgart
Gemarkung Stuttgart
Genehmigt

-DECKBLATT-
v.25.02.2011




am 15. NOV. 2011

LAGEPLAN

Landeshauptstadt Stuttgart
Baurechtsamt

- zeichnerischer Teil zum Bauantrag (§ 4 LBOVVO) -

Entwürfe nach § 16 Abs. 1 LBOVVO

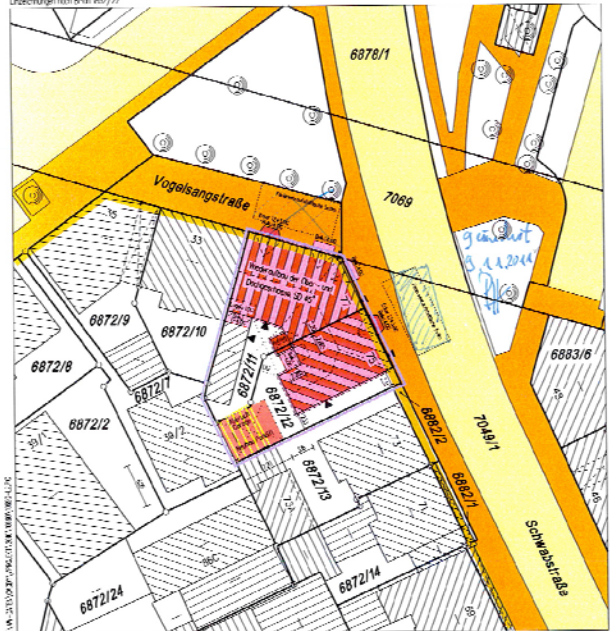

Eventuell vorhandene unterirdische Versorgungsleitungen im Baugrundstück sind nicht dargestellt

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und Einzelzeichnungen nach § 4 Abs. 3, 4 und 5 LBOVVO

Stuttgart, den 25.02.2011

Ingenieurbüro für Vermessungswesen

Andreas Weber



m Westkaí 9A, 70327 Stuttgart, Tel./Fax: (0714) 4077272/4077273
Erlowaldchen 8, 71622 Backnang, Tel./Fax: (0714) 59340/596381



C

Schwabstr 75

Schwabstr 77

Vogelsangstr 33

Aktueller Bautenstand:

1. Erstellung der Hohlwände im 3.OG

Im Bauvorhaben sind die Hohlwände bis zum 3.OG angebracht und betoniert. Schritt für Schritt werden im weiteren Verlauf die restlichen Wände an Ihren „Platz“ gesetzt und ggf. geschalt und betoniert. Die Maurerarbeiten werden mit KS-Steinen weitergeführt.





2. Decke über 3.OG

Die Decke über 3.OG ist geschalt und betoniert. Die restlichen Decken werden sukzessiv nach setzen der Hohlwände Etagenweise angebracht.





2. Fassadenelemente

Die Fassadenelemente im Bereich der Schwabstrasse 75-77 sind bis einschließlich 3.OG angebracht. Die Fassadenoberfläche wird durch Folien vor Beschädigungen geschützt.





Zusammenfassung:

Aktuell durchgeführte Arbeiten	Fertigstellungsgrad
Baustelleneinrichtung	90%
Abbruch	95%
Gerüstarbeiten	80%
Rohbauarbeiten	70%
Vorbereitende Maßnahmen Fundamente	100%
Fassadenabspritzung	100%
Fassadenelemente	70%
Elementdecke 3.OG	95%
Hohlwände 3.OG	95%
