




BISMARCKHAUS
Innovation trifft Leidenschaft


„Bismarckhaus“ in 70197 Stuttgart

Stand der Baustelle



Bauvorhaben: „Bismarckhaus“, Schwabstr. 75-77 in 70197 Stuttgart
Betrachtungszeitraum: September -Oktober 2013
Bauherr: Demiri

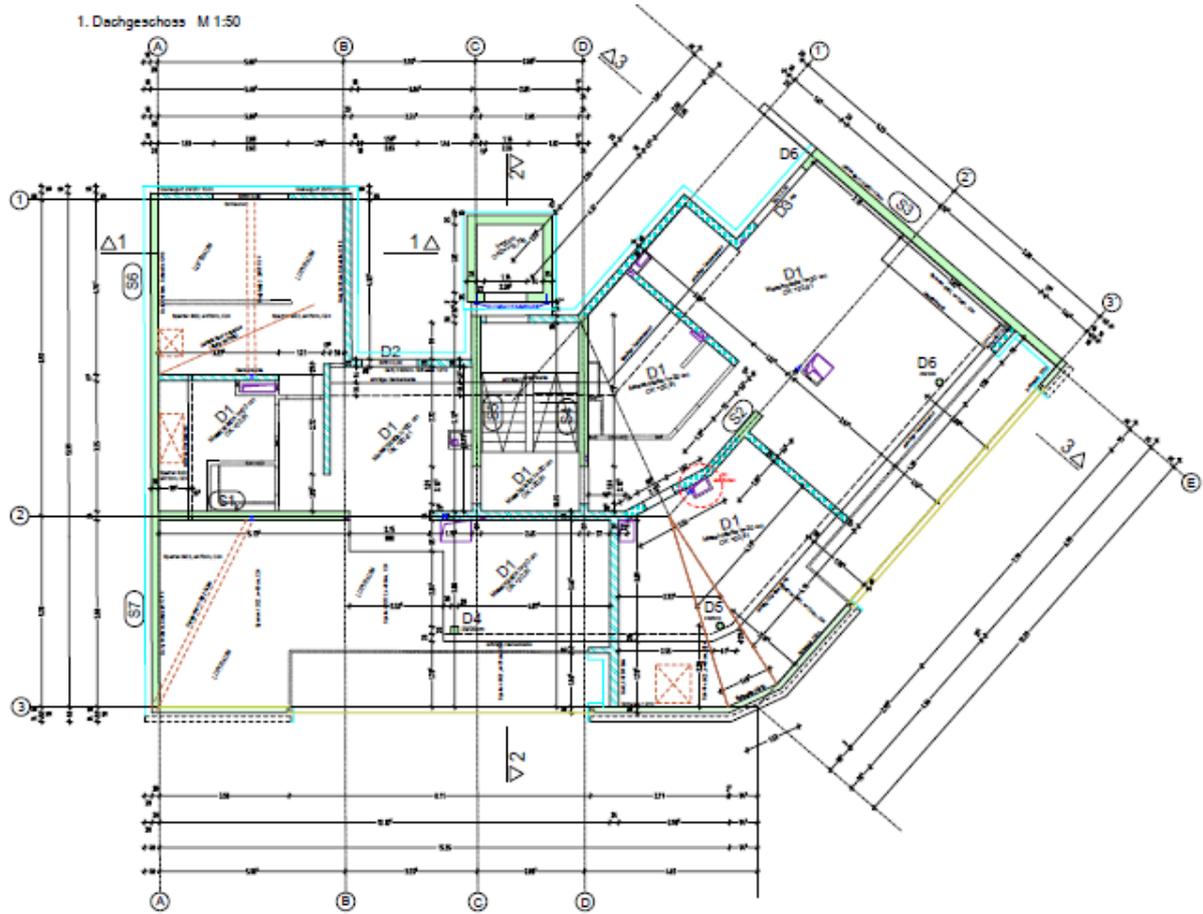

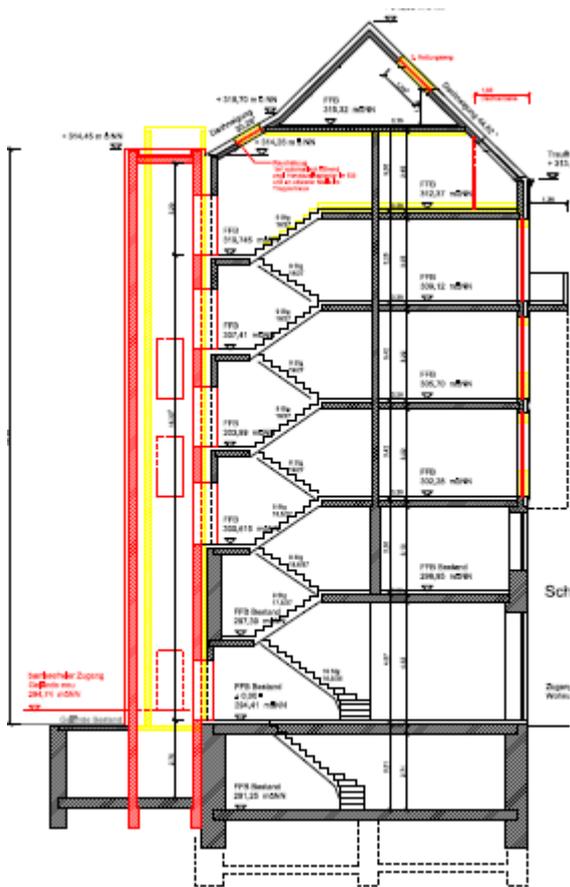

Landeshauptstadt Stuttgart
Gemarkung Stuttgart
Genehmigt

-DECKBLATT-
v.25.02.2011




am 15. NOV. 2011

LAGEPLAN

Landeshauptstadt Stuttgart
Baurechtsamt - zeichnerischer Teil zum Bauantrag (§ 4 LBOVVO) -

Entwürfen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1

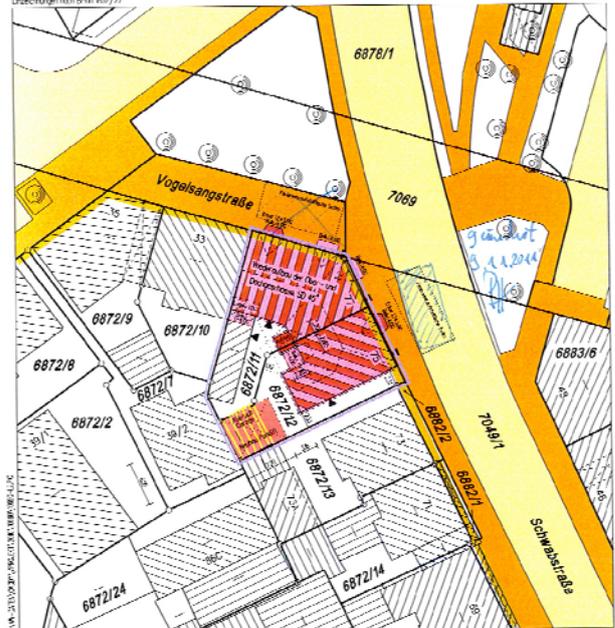

Eventuell vorhandene unterirdische Versorgungsleitungen im Baugrundstück sind nicht dargestellt

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und Einzelzeichnungen nach § 4 Abs. 3, 4 und 5 LBOVVO

Stuttgart, den 25.02.2011

Ingenieurbüro für Vermessungswesen

Andreas Weber



m Westkaí 9A, 70327 Stuttgart, Tel./Fax: (0714) 4077272/4077273
Erlowaldchen 8, 71622 Backnang, Tel./Fax: (0714) 59340/596381



C

Schwabstr 75

Schwabstr 77

Vogelsangstr 33

Aktueller Bautenstand:

1. Erstellung der Hohlwände im EG

Im Bauvorhaben sind die Hohlwände im Bereich EG angebracht und betoniert. Schritt für Schritt wurden im weiteren Verlauf die restlichen Wände an Ihren „Platz“ gesetzt und ggf. geschalt und betoniert.





2. Decke über EG

Die Decke über EG ist geschalt und fertig zum Betonieren. Die restlichen Decken werden sukzessiv nach setzen der Hohlwände angebracht.





Zusammenfassung:

Aktuell durchgeführte Arbeiten	Fertigstellungsgrad
Baustelleneinrichtung	80%
Abbruch	95%
Gerüstarbeiten	15%
Rohbauarbeiten	20%
Vorbereitende Maßnahmen Fundamente	100%
Fassadenabsprießung	100%
Hohlwände EG	90%
Elemtdecke EG	50%
